

# Checkliste Lift-Plattform XS

Version 1.2



Vor dem Einsatz ist die mitgelieferte Aufbau- und Verwendungsanleitung zu lesen, sowie die Checkliste korrekt auszufüllen. Sie finden alle sicherheitsrelevanten Dokumente auch auf unserer Webseite. Falls Zweifel betreffend dem technischen Zustand oder der korrekten

Anwendung bestehen oder eine standardmässige Verwendung durch Verhinderung von Absätzen, Bordüren, Brüstungen nicht möglich ist, ist zwingend der Hersteller zu kontaktieren.



Vergleichen Sie die Versionsnummer (siehe Kopfzeile) der vorliegenden Checkliste mit der Version auf unserer Website. Es darf nur die aktuelle Version verwendet werden.  
[www.mbt.swiss/981](http://www.mbt.swiss/981)


| Schachtbreite                            | Flächenlast:               | Randlast:                                                               |
|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 0.60 m - 2.60 m<br>(mit zwei Kanthölzer) | max. 300 kg/m <sup>2</sup> | max. 3'200 kg                                                           |
|                                          |                            | (Schachtschalung komplett montiert entlang des Schachtrandes auflegen!) |

Unternehmer: .....

Baustelle: .....

## Zusammensetzen der Lift-Plattform XS:

| Schritt | Aktion                                                                                 | Erledigt                 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1       | Zusammensetzen erfolgte gemäss Aufbau- und Verwendungsanleitung.                       | <input type="checkbox"/> |
| 2       | Lift-Plattform XS auf Verformung, Quetschung, Rissbildung kontrolliert.                | <input type="checkbox"/> |
| 3       | Alle Schraubenverbindungen kontrolliert, ob Diese fest angezogen sind.                 | <input type="checkbox"/> |
| 4       | <b>Breite</b> Lift-Plattform = Schachtbreite SB - 6 cm. SB _____ - 6 cm = _____        | <input type="checkbox"/> |
| 5       | <b>Tiefe</b> Lift-Plattform = Schachttiefe ST - 3 cm. ST _____ - 3 cm = _____          | <input type="checkbox"/> |
| 6       | <b>Spannweite S</b> bei zwei Kanthölzer = SB - 28 cm ≤ 232 cm SB _____ - 28 cm = _____ | <input type="checkbox"/> |
| 7       | <b>Kantholzlänge KL</b> = ST - 27 cm ≤ 113 cm ST _____ - 27 cm = _____                 | <input type="checkbox"/> |
| 8       | Gerüstbretthöhe = 6 cm.                                                                | <input type="checkbox"/> |
| 9       | Hinweisschild vorhanden.                                                               | <input type="checkbox"/> |

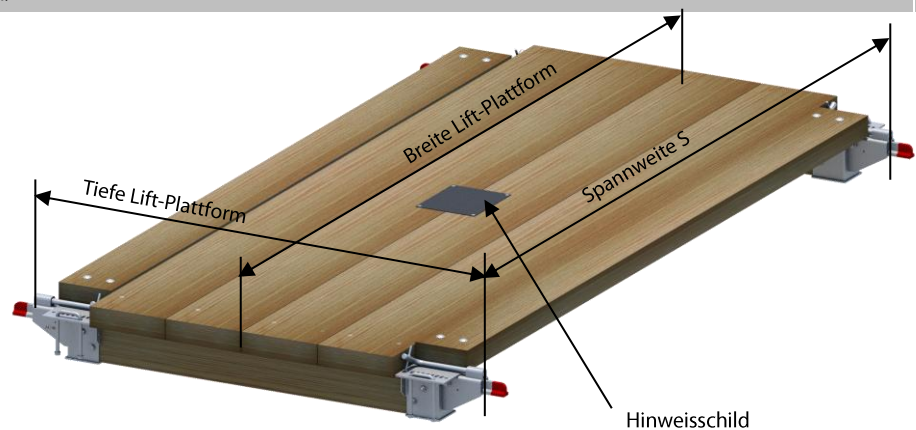

Plattform mit zwei Kanthölzern

### Montage durch:

|                 |  |
|-----------------|--|
| Vorname / Name: |  |
| Datum:          |  |
| Unterschrift:   |  |

### Kontrolle durch Sicherheitsverantwortlichen auf Baustelle:

|                 |  |
|-----------------|--|
| Vorname / Name: |  |
| Datum:          |  |
| Unterschrift:   |  |






ABSCHALUNG  
SICHERHEIT  
FIXATION

Märgert G&C Bautechnik AG  
[www.mbt-bautechnik.ch](http://www.mbt-bautechnik.ch)  
+41 (0)41 610 85 53  
[info@mbt-bautechnik.ch](mailto:info@mbt-bautechnik.ch)

Original Checkliste  
V 1.2 / 13.11.2025 / ZP / C05077.de

## Versetzen oder Umsetzen der Lift-Plattform XS:

| Schritt | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                | Erledigt                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 10      | Die BKA Pro Aussparungen Breit sind gemäss Aufbau- und Verwendungsanleitung versetzt. <ul style="list-style-type: none"> <li>Von Innenkante Schacht bis zu Achsmitte der BKA Pro Aussparung 14 cm.</li> <li>Von Deckenoberkante bis zur Oberkante BKA Pro Aussparung 6 cm.</li> </ul> | <input type="checkbox"/> |
| 11      | Die rote Markierung an den Pendeltragholmen sind nicht abgeblättert oder abgeschabt.                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| 12      | Die Lift-Plattform XS ist gemäss Aufbau- und Verwendungsanleitung an ihren Einsatzort versetzt worden.                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| 13      | Schachttiefe minus Traversenlänge = 2.5 cm bis 3.5 cm                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| 14      | Die rote Markierung des Pendeltragholms liegt komplett in der Aussparung auf und ist in der Flucht zur Wand nicht mehr sichtbar.                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| 15      | Der Sicherungsbolzen ist komplett in der Aussparung eingeschoben                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| 16      | Der Sicherungsbolzen ist umgelegt und das Quereisen des Sicherungsbolzen ist in den Langlöchern des Schuh's eingehängt.                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| 17      | Das Hinweisschild auf der Lift-Plattform XS ist vorhanden.                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |

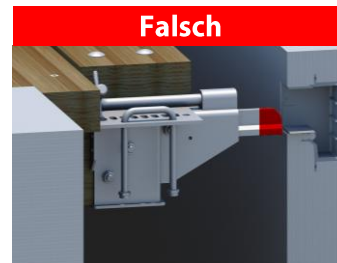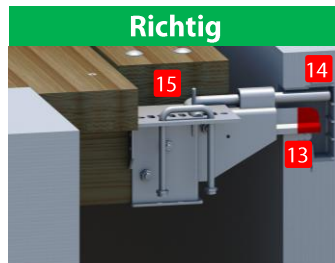

### **Versetzung durch:**

|            |                       |  |
|------------|-----------------------|--|
| Stockwerk: | Vorname / Name:       |  |
|            | Datum / Unterschrift: |  |
| Stockwerk: | Vorname / Name:       |  |
|            | Datum / Unterschrift: |  |
| Stockwerk: | Vorname / Name:       |  |
|            | Datum / Unterschrift: |  |
| Stockwerk: | Vorname / Name:       |  |
|            | Datum / Unterschrift: |  |
| Stockwerk: | Vorname / Name:       |  |
|            | Datum / Unterschrift: |  |
| Stockwerk: | Vorname / Name:       |  |
|            | Datum / Unterschrift: |  |
| Stockwerk: | Vorname / Name:       |  |
|            | Datum / Unterschrift: |  |
| Stockwerk: | Vorname / Name:       |  |
|            | Datum / Unterschrift: |  |
| Stockwerk: | Vorname / Name:       |  |
|            | Datum / Unterschrift: |  |
| Stockwerk: | Vorname / Name:       |  |
|            | Datum / Unterschrift: |  |

### **Kontrolle durch Sicherheitsverantwortlichen:**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Vorname / Name:       |  |
| Datum / Unterschrift: |  |
| Vorname / Name:       |  |
| Datum / Unterschrift: |  |
| Vorname / Name:       |  |
| Datum / Unterschrift: |  |
| Vorname / Name:       |  |
| Datum / Unterschrift: |  |
| Vorname / Name:       |  |
| Datum / Unterschrift: |  |
| Vorname / Name:       |  |
| Datum / Unterschrift: |  |
| Vorname / Name:       |  |
| Datum / Unterschrift: |  |
| Vorname / Name:       |  |
| Datum / Unterschrift: |  |
| Vorname / Name:       |  |
| Datum / Unterschrift: |  |
| Vorname / Name:       |  |
| Datum / Unterschrift: |  |
