

Check-list Plateforme Lift XS

Version 1.0



Lire attentivement les Instructions de montage et d'utilisation fournies et compléter soigneusement la check-list avant utilisation. Vous trouverez tous les documents importants pour la sécurité sur notre site Internet. Contacter impérativement le fabricant en cas

de doute concernant l'état technique ou l'utilisation correcte du produit ou si une utilisation standard est impossible en raison de défauts de surface, de bordures ou de rambardes.



Comparer le numéro de version (voir en-tête) de la présente check-list avec la version disponible sur notre site Internet. Seule la version la plus récente doit être utilisée.
www.mbt.swiss/981

Largeur cage SB:	Charge de surface:	Charge au bord:
0.60 m - 2.60 m (avec deux bois équarris)	max. 300 kg/m ²	max. 3'200 kg
		(poser le coffrage de cage complet le long du bord de la cage!)


Entrepreneur:

Chantier:

Numéro de série:

Assemblage de la plateforme Lift XS:

Étape	Action	Fait
1	Montage effectué conformément aux instructions de montage et d'utilisation.	☐
2	Déformations, pincements, fissures contrôlées sur la plateforme Lift XS.	☐
3	Contrôler si tous les raccords vissés est bien serrés.	☐
4	Largeur plateforme Lift = largeur cage SB – 6 cm. SB _____ - 6 cm = _____	☐
5	Profondeur plateforme Lift : profondeur cage ST – 3 cm. ST _____ - 3 cm = _____	☐
6.1	Portée S avec deux carrelots de coffrage = SB-28 cm < 140 cm SB _____ -28 cm = _____	☐
6.2	Longueur du bois équarri KL = ST-27 cm ST _____ - 27 cm = _____	☐
7	Hauteur de planche d'échafaudage = 6 cm.	☐
8	Plaque signalétique présente.	☐

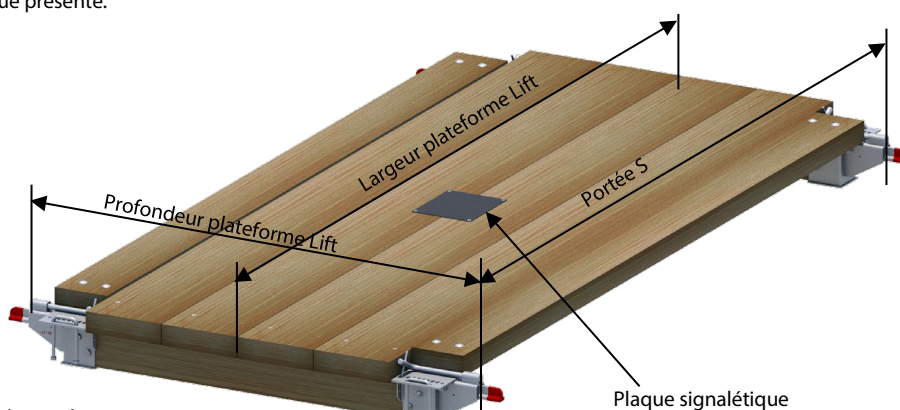

Plateforme avec deux bois équarri

☑ Montage effectué par:

Prénom / Nom:	
Date:	
Signature:	

☑ Contrôle par responsable de la sécurité sur le chantier:

Prénom / Nom:	
Date:	
Signature:	






ABSCHALUNG
SICHERHEIT
FIXATION

Mägert G&C Bautechnik AG
www.mbt-bautechnik.ch
+41 (0)41 610 85 53
info@mbt-bautechnik.ch

Traduction de Check-list originales allemandes
V 1.0 / 13.10.2023 / GR / C05077.fr

Mise en place de la plateforme Lift XS:

Étape	Action	Fait
9	Les quatre réservations BKA Pro large sont décalés selon les instructions de montage et d'utilisation. - La distance du bord intérieur de la cage au centre de l'axe de réservations BKA Pro large sa ce 14 cm. - La distance du bord supérieur du plafond au bord supérieur du réservations BKA Pro larges sa ce 6 cm. - Pour la plate-forme d'ascenseur avec trois traverses, évidement BKA Pro large au milieu de la largeur de la gaine	☐
10	Le marquage rouge du longeron de support ne sont pas pelées ou grattées.	☐
11	La plateforme Lift XS mise en place effectué conformément aux instructions de montage et d'utilisation.	☐
12	Profondeur de la gaine moins longueur de la traverse = 2.5 cm bis 3.5 cm	☐
		
13	Le marquage rouge du longeron de support se trouve entièrement dans le renforcement et n'est plus visible dans l'alignement de la paroi.	☐
14	La guopille de sécurité est entièrement insérée dans la réservation.	☐
15	La goupille de sécurité est rabattue et la ferrure transversale de la goupille est accrochée dans les trous oblongs de la traverse.	☐
16	La plaque signalétique sur la plateforme de Lift présente.	☐

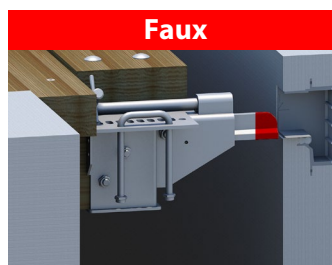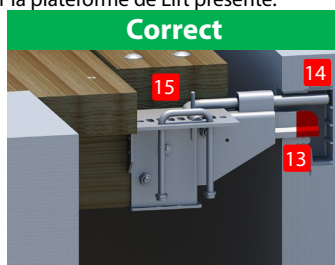

Mise en place effectué par:

Etage:	Prénom / Nom:		
	Date:/ Signature:		
Etage:	Prénom / Nom:		
	Date:/ Signature:		
Etage:	Prénom / Nom:		
	Date:/ Signature:		
Etage:	Prénom / Nom:		
	Date:/ Signature:		
Etage:	Prénom / Nom:		
	Date:/ Signature:		
Etage:	Prénom / Nom:		
	Date:/ Signature:		
Etage:	Prénom / Nom:		
	Date:/ Signature:		
Etage:	Prénom / Nom:		
	Date:/ Signature:		
Etage:	Prénom / Nom:		
	Date:/ Signature:		

Contrôle par responsable de la sécurité:

Prénom / Nom:		
Date:/ Signature:		
Prénom / Nom:		
Date:/ Signature:		
Prénom / Nom:		
Date:/ Signature:		
Prénom / Nom:		
Date:/ Signature:		
Prénom / Nom:		
Date:/ Signature:		
Prénom / Nom:		
Date:/ Signature:		
Prénom / Nom:		
Date:/ Signature:		
Prénom / Nom:		
Date:/ Signature:		
Prénom / Nom:		
Date:/ Signature:		
