Checkliste
Lift-Plattform XS

Version 1.3

Vor dem Einsatz ist die mitgelieferte Aufbau- und Verwendungsanleitung zu lesen, sowie die Checkliste korrekt auszufüllen. Sie finden alle sicherheitsrelevanten Dokumente auch auf unserer Webseite. Falls Zweifel betreffend dem technischen Zustand oder der korrekten Anwendung bestehen oder eine standardmässige Verwendung durch Verhinderung von Absätzen, Bordüren, Brüstungen nicht möglich ist, ist zwingend der Hersteller zu kontaktieren.

Vergleichen Sie die Versionsnummer (siehe Kopfzeile) der vorliegenden Checkliste mit der Version auf unserer Website. Es darf nur die aktuelle Version verwendet werden.
www.mbt.swiss/981


Schachtbreite	Flächenlast:	Randlast:
0.60 m - 2.60 m (mit zwei Kanthölzer)	max. 300 kg/m²	max. 3'200 kg
		(Schachtschalung komplett montiert entlang des Schachtrandes auflegen!)

Unternehmer: .....

Baustelle: .....

Zusammensetzen der Lift-Plattform XS:

Schritt	Aktion		Erledigt
1	Zusammensetzen erfolgte gemäss Aufbau- und Verwendungsanleitung.		❑
2	Lift-Plattform XS auf Verformung, Quetschung, Rissbildung kontrolliert.		❑
3	Alle Schraubenverbindungen kontrolliert, ob Diese fest angezogen sind.		❑
4	**Breite** Lift-Plattform = Schachtbreite SB – 6 cm.	SB_____ - 6 cm = _____	❑
5	**Tiefe** Lift-Plattform = Schachttiefe ST – 3 cm.	ST_____ - 3 cm = _____	❑
6	**Spannweite** S bei zwei Kanthölzer = SB-28 cm ≤ 232 cm	SB_____ - 28 cm = _____	❑
7	**Kantholzlänge** KL = ST – 27.5 cm ≤ 1125 cm	ST_____ - 27.5 cm = _____	❑
8	Gerüstbretthöhe = 6 cm.		❑
9	Hinweisschild vorhanden.		❑

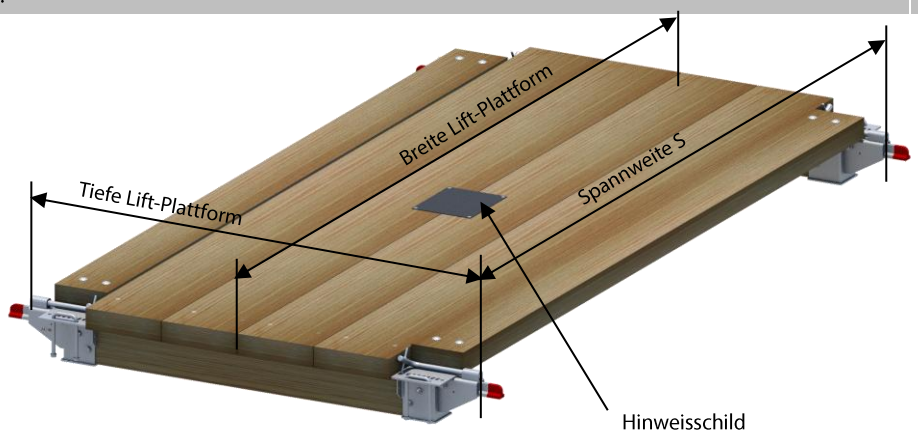

Plattform mit zwei Kanthölzern

Montage durch:

Vorname / Name:	
Datum:	
Unterschrift:	


Kontrolle durch Sicherheitsverantwortlichen auf Baustelle:

Vorname / Name:	
Datum:	
Unterschrift:	

Mägert G&C Bautechnik AG
www.mbt-bautechnik.ch
+41 (0)41 610 85 53
info@mbt-bautechnik.ch

Original Checkliste
V 1.3 / 13.10.2026 / ZP / C05077.de


Versetzen oder Umsetzen der Lift-Plattform XS:

Schritt	Aktion	Erledigt
10	Die BKA Pro Aussparungen Breit sind gemäss Aufbau- und Verwendungsanleitung versetzt. ▪ Von Innenkante Schacht bis zu Achsmitte der BKA Pro Aussparung 14 cm. ▪ Von Deckenoberkante bis zur Oberkante BKA Pro Aussparung 6 cm.	❑
11	Die rote Markierung an den Pendeltragholmen sind nicht abgeblättert oder abgeschabt.	❑
12	Die Lift-Plattform XS ist gemäss Aufbau- und Verwendungsanleitung an ihren Einsatzort versetzt worden.	❑
13	Schachttiefe minus Traversenlänge = 2.5 cm bis 3.5 cm 	❑
14	Die rote Markierung des Pendeltragholms liegt komplett in der Aussparung auf und ist in der Flucht zur Wand nicht mehr sichtbar.	❑
15	Der Sicherungsbolzen ist komplett in der Aussparung eingeschoben	❑
16	Der Sicherungsbolzen ist umgelegt und das Quereisen des Sicherungsbolzen ist in den Langlöchern des Schuh's eingehängt.	❑
17	Das Hinweisschild auf der Lift-Plattform XS ist vorhanden.	❑

Richtig



Falsch



Versetzung durch:

Stockwerk:	Vorname / Name:		
	Datum / Unterschrift:		
Stockwerk:	Vorname / Name:		
	Datum / Unterschrift:		
Stockwerk:	Vorname / Name:		
	Datum / Unterschrift:		
Stockwerk:	Vorname / Name:		
	Datum / Unterschrift:		
Stockwerk:	Vorname / Name:		
	Datum / Unterschrift:		
Stockwerk:	Vorname / Name:		
	Datum / Unterschrift:		
Stockwerk:	Vorname / Name:		
	Datum / Unterschrift:		
Stockwerk:	Vorname / Name:		
	Datum / Unterschrift:		
Stockwerk:	Vorname / Name:		
	Datum / Unterschrift:		
Stockwerk:	Vorname / Name:		
	Datum / Unterschrift:		
Stockwerk:	Vorname / Name:		
	Datum / Unterschrift:		

Kontrolle durch Sicherheitsverantwortlichen:

Vorname / Name:		
Datum / Unterschrift:		
Vorname / Name:		
Datum / Unterschrift:		
Vorname / Name:		
Datum / Unterschrift:		
Vorname / Name:		
Datum / Unterschrift:		
Vorname / Name:		
Datum / Unterschrift:		
Vorname / Name:		
Datum / Unterschrift:		
Vorname / Name:		
Datum / Unterschrift:		
Vorname / Name:		
Datum / Unterschrift:		
Vorname / Name:		
Datum / Unterschrift:		
Vorname / Name:		
Datum / Unterschrift:		
